

<b>관리번호</b> 5-3	<b>Sunset 감성예술길 조성</b>
--------------------	------------------------

<b>사업구분</b>	계속사업	<b>사업주체</b>	구
<b>사업기간</b>	2022년~2024년	<b>추진상황(%)</b>	추진완료(100%)
<b>소요예산</b>	5,920백만원	<b>완료시기</b>	임기내
<b>추진부서</b>	산림녹지과 (김철준 ☎4522 유연정 ☎4522)	<b>협조부서(기관)</b>	건설과(최우준 ☎4692)

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표(최종목표)

- 다대포해변에서 장림항을 거쳐 낙동강변을 따라 조성된 보행길을 구간별 특색을 살리는 도심갈맷길로 조성하여 쾌적한 보행환경 제공 및 관광명소로 도약
- 갈맷길 신규 코스 조성으로 갈맷길 브랜드 이미지를 제고하여 관광·문화·체육분야 활성화 도모

### □ 사업개요

- 사업명 : Sunset 감성예술길 조성 사업
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 11월
- 사업위치 : 낙동강 하구둑 ~ 다대포해수욕장 일원
- 사업비 : 5,920백만원(시비3,202.5, 구비1,617.5, 기타1,100)
- 주요사업
  - ▷ 강변대로 「해안산책 그린웨이(Green-Way)」 조성
  - ▷ 강변대로 「도심갈맷길 미관개선」 사업
  - ▷ 다대포해변공원 「고우니 생태길 정비」 사업
  - ▷ 장림항 보행교 설치 사업

### □ 세부추진계획

- 강변대로 「해안산책 그린웨이(Green-Way)」 조성 (산림녹지과)
  - ▷ 조성구간 : 장림포구 ~ 노을정(3km)
  - ▷ 내 용 : 법면녹화(녹색토공법 A=12,000㎡[L=3km, B=4m])
  - ▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.
  - ▷ 사업비 : 695백만원
- 강변대로 「도심갈맷길 미관개선」 사업 (산림녹지과)
  - ▷ 조성구간 : 강변대로 신평장림산업단지 일원
  - ▷ 내 용 : 메시웬스 500경간 설치(L=1km, W=2m, H=2m)
  - ▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 9.
  - ▷ 사업비 : 75백만원

○ 다대포해변공원 「고우니 생태길 정비」 사업 (산림녹지과)

- ▷ 조성구간 : 다대포해변공원 일원
- ▷ 내 용 : 파고라, 전망대 1개소, 목재데크 등 정비
- ▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 9.
- ▷ 사 업 비 : 250백만원

○ 장림항 보행교 설치 사업 (건설과)

- ▷ 조성구간 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항)
- ▷ 내 용 : 장림항 보행교 설치 1식 (L=90m, B=4~8m)
  - 장림보행교 조성사업 2개년도 사업으로 추진
- ▷ 사업기간 : 2022. 2 ~ 2024. 10.
- ▷ 사 업 비 : 4,900백만원

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	17.3%	83.4%	100 %	%	%	
해안산책로 그린웨이 조성사업	사업완료					
감성예술길 미관개선 사업	사업완료					
고우니 생태길 정비사업	사업완료					
장림보행교 설치사업	市계약심사 공사 착공	공사 추진	공사 준공			

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,920		5,920	5,920					
국 비									
시 비	3,202.5		3,202.5	3,202.5					
구 비	1,617.5		1,617.5	1,617.5					
기 타	1,100		1,100	1,100					

## 【추진실적】

- 2022. 01. : 부산광역시 「도심갈맷길 300리 조성사업」 공모 선정
- 2022. 02. : 미관개선사업 경계 측량
- 2022. 03. : 고우니생태길 정비사업 실시설계용역 발주
- 2022. 04. : 해안산책로 그린웨이 조성사업 실시설계용역 발주
- 2022. 05. ~ 09. : 고우니생태길 정비사업 공사 준공
- 2022. 05. ~ 09. : 강변대로 「도심갈맷길 미관개선」 사업 공사 준공
- 2022. 09. : 해안산책로 그린웨이 조성사업 공사 착공
- 2022. 09. : 장림항 보행교 설치 사업 市 계약심사 이행
- 2022. 10. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 발주
- 2022. 12. : 해안산책 그린웨이 조성사업 공사 준공
- 2022. 12. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 착공
- 2023. 05. : 장림항 보행교 건설사업관리용역 착수
- 2023. 07. : 장림항 보행교 교량 상부(강교) 제작 착수
- 2023. 12. : 장림항 보행교 교량 하부기초(교각) 설치 완료, 상부(강교) 제작 완료
- 2024. 07. : 장림항 보행교 교량 상부(강교) 설치 완료
- 2024. 08. : 상부 목재데크 및 캐노피 설치중
- 2024. 11. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	2회	-

## 【기대효과】

- 을숙도~장림포구~해안산책로~고우니생태길~동측지구로 이어지는 생태 및 낙조경관에 특화된 도심갈맷길 조성으로 갈맷길 브랜드 이미지 제고
- 다양한 보행환경 개선으로 걷고 싶은 보행길, 다시 찾고 싶은 관광지로의 도약

# 【관련사진】


## 조감도




## 현장사진



해안산책로 그린웨이 조성

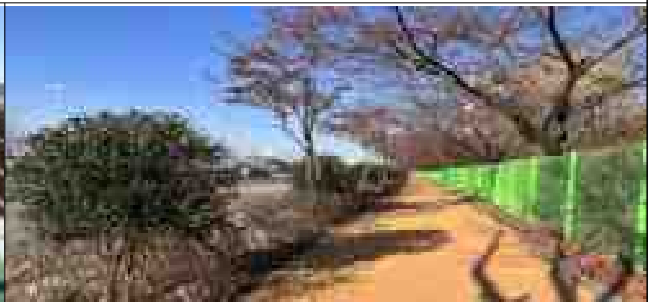

감성예술길 미관개선 사업

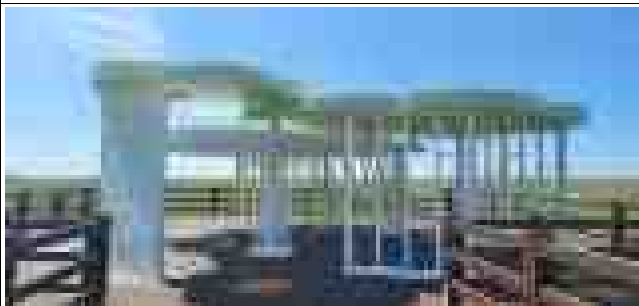

고우니 생태길 정비사업



장림항 보행교 조성
