

관리번호
6-4-1

생활안전 및 구민생명 위해요소 해소

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	3,202백만원	완료시기	임기내
추진부서	안전총괄과 민방위관제담당(김지형 24342)	협조부서(기관)	-

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 범죠퉈약지의 생활안전 및 범죠퉈방이 가능한 방범용 CCTV 시스템 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 3,202백만원(특별교부세 2,860, 구비 342)
- 사업내용
 - 방범용 CCTV 191개소 구축 : 3,202백만원

□ 추진실적

- 방범용 CCTV 191개소 구축
 - 2022년 : 방범용 CCTV 60개소 구축(1차 21개소, 2차 39개소) 완료
 - 2023년 : 방범용 CCTV 41개소 구축(1차 6개소, 2차 24개소, 3차 11개소) 완료
 - 2024년 : 방범용 CCTV 55개소 구축(1차 3개소, 2차 28개소, 3차 24개소) 완료
 - ※ 2차 2025년 1월 준공, 3차 2025년 2월 준공.
 - 2025년 : 방범용 CCTV 35개소 구축 (2025년 11월 준공)
- 사업추진목표 100% 달성

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
목표 달성률	31%	53%	54%	90%	100%	
CCTV 설치 (누적 개소 수)	60	101	104	171	191	

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계									
국 비									
시 비									
구 비	342		342		302	40			
특별 교부세	2,860		2,860	1,200	400	760	500		

【추진실적】

○ 방범용 CCTV 설치 개소 수

(단위 : 백만원)

세부추진내용	추진실적						사업비 (누적)
	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년	
실적 달성률	31%	53%	54%	82%	100%		
CCTV 설치 (누적 개소 수)	60	101	104	156	191		3,202

※ 2025년말 사업추진목표 191개소 달성 예정

【문제점 및 대책】

○ 문제점

- 방법용 CCTV의 설치요청 대비 사업추진 예산 부족
- 골목, 현수막, 간판 등 CCTV의 시야를 방해하는 요소가 많음

○ 대책

- CCTV와 함께 안전한 귀가를 책임지는 ‘사하안심귀가앱’ 과 같이 시너지가 날 수 있는 안전프로그램의 보급 필요.
- 이면도로, 노후주택 밀집지, 1인 주거지 등에 방법용 CCTV 설치 비율을 높여 안전 체감도 상승효과 유도

【금후계획】

- 사업추진 목표는 달성하였으나 구민 불안감 해소와 안전사회 구축을 위한 방법용 CCTV 구축을 위한 예산의 지속 확보를 위해 노력

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

【기대효과】


- 골목길 및 노후주택 밀집지역에 방법용 CCTV를 설치하여 주민 불안감 해소
- CCTV 설치를 통해 사각지대 최소화 및 범죄 발생 예방 효과 기대

【관련사진】

방법용 CCTV 신규 설치 전



방법용 CCTV 신규 설치 후

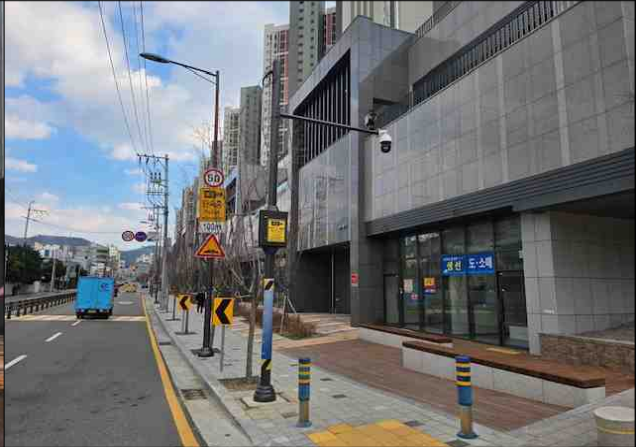

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	일부추진(78%)
소요예산	6,200백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시재생과 도로조명담당(정서훈 4672)	협조부서(기관)	-

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 도로조명 LED보급률 2026년까지 100%를 달성으로 안전한 도로조명 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 6,200백만원(구비 6,052, 시비 148)
- 사업내용
 - ▷ 도로조명시설 정비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구분	사업내용	사업비	비고
가로등	LED 가로등기구 교체 750,000원 × 4,427등 =	3,300	
	노후 FRP가로등 교체 1,054,210원 × 664본(등) =	700	완료
보안등	LED 보안등기구 교체 500,000원 × 4,233등 =	2,200	

□ 세부추진계획

- 도로조명시설 정비 : 도로조명설비 중장기 계획에 따른 연차별 LED조명 교체
 - ▷ (가로등) 노후 가로등기구(방전등)를 LED가로등기구로 교체 추진(연5.6억)
 - 관내 FRP가로등 교체 완료(2022 ~ 2025년, 사업비 700백만원)
 - 광로 및 대로 구간은 시비를 확보하여 추진
 - ▷ (보안등) 재개발 지역을 제외한 인구밀집 지역 우선순위 교체 추진(연 4억)

□ 연차별 추진계획

(단위 : 백만원)

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	43%	60%	73%	87%	100%	
LED가로등(누적) (보급률)	3,548 (46%)	4,706 (61%)	5,709 (74%)	7,400 (94%)	7,846 (100%)	
LED보안등(누적) (보급률)	2,749 (48%)	3,494 (61%)	4,238 (74%)	4,983 (86%)	5,753 (100%)	

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	6,200		6,200	1,478	1,450	1,230	1,230	812	
국 비									
시 비	148		148	148					
구 비	6,052		6,052	1,330	1,450	1,230	1,230	812	
특별 교부세									

【추진실적】

○ 도로조명시설 정비

(단위 : 백만원)

세부추진내용	계획/실적										사업비 (누적)
	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년		
	43%	47%	60%	60%	73%	72%	87%	78%	100%	-	
LED가로등(누적) (보급률)	3,548 (46%)	3,959 (58%)	4,706 (61%)	5,630 (75%)	5,709 (74%)	7,105 (90%)	7,400 (94%)	7,915 (99%)	7,962 (100%)	-	3,013
LED보안등(누적) (보급률)	2,749 (48%)	1,872 (33%)	3,494 (61%)	2,546 (42%)	4,238 (74%)	2,712 (47%)	4,983 (86%)	3,310 (57%)	5,823 (100%)	-	405

* 총수량 = 계획수립 당시 전체수 등수[신설 조명등은 전량LED로 보급(교체)실적에서 제외]

【문제점 및 대책】

○ 문제점

- ▷ 관내 강도와 지지력이 약한 노후 FRP가로등(50본)의 안전사고 위험 상존
- ▷ 광효율이 낮은 방전등 사용에 따른 에너지 효율 저하

※ 도로조명시설 현황

(2025. 12월 기준)

구분	전체(등)	LED보급(등)	보급률(%)	부산시 지자체 보급률 순위
계	13,785	11,225	78	연말 집계 예정
가로등	7,962	7,915	99	
보안등	5,823	3,310	57	

○ 대책

- ▷ 예산 확보 방안을 다각도로 강구, 사업비 확보방안 적극 발굴하여 노후(FRP) 가로등 및 고효율 LED 등기구 교체 병행 추진

【금후계획】

○ 도로조명시설 정비

- ▷ 2025. ~ : 소규모 조명시설 정비는 민원다수 지역 우선으로 LED조명 교체 추진
- ▷ 2025. ~ 2026. : 자원조달계획에 의거 매년 도로조명 LED 교체 예산 투자

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

【기대효과】

- 고효율 LED등기구를 설치하여 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 제공

【관련사진】

노후 가로등(FRP) 현장사진



LED조명 교체사진(강변대로)



노후 가로등(FRP) 교체 전



노후 가로등(FRP) 교체 후

