

## [완료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	미세먼지 저감 수림대 조성 (신평·장림공단 및 감천항 주변 녹지 조성)	관리번호	1-9
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	산림녹지과, 녹지담당 (송신영 ☎4532)	협조부서 (담당자, 전화)	市 산림생태과 유만수 (☎888-3872)
		추진상황(률)	사업완료(100%)
사업기간	2018년 ~ 2020년	소요예산	6,875백만원

### 【사업추진계획】

#### 사업추진목표

- 미세먼지 발생이 많은 공단 및 항만을 중심으로 미세먼지를 저감 할 수 있는 수림대를 조성하여, 주민들에게 쾌적하고 건강한 생활환경 제공

#### 사업개요

구분	대 상 지		규 모		조성내용	사업비 (백만원)	비고
			면적(m <sup>2</sup> )	연장(km)			
계	장림유수지 등 8개소		43,080	6.33	수목 162,194주 식재 등	6,875	'18.~'20.
1~4	신평·장림공단 수림대 조성	장림유수지, 하신중앙로, 다대항, 다송로	21,100	2.0	교목 등 29,579주 식재	1,410	'18.
5	을숙도대로 가로숲 조성	장림롯데마트~을숙도대로	6,000	1.5	가로수 등 35,514주	1,000	'19.
6	구평택지 내 완충녹지 녹화	구평이편한세상@ 인근	5,000	0.5	수목 8,442주 등	250	'19.
7	감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성	감천항 중앙부두~ 구평고개 사거리	9,480	1.58	수목 69,590주 등	3,000	'19.~'20.
8	감천로 바람길숲 조성	고신대병원 ~ 사하구 국민체육센터	1,500	0.75	수목 19,069주 등	1,215	'20

#### 세부추진계획

- 2018. : 미세먼지 저감 수림대 조성공사 완료(4개소)
- 2019. : 을숙도대로 등 도시녹화사업 추진(2개소)
- 2020. : 감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성사업 추진(2개소)

#### 연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	20%	40%	100%	100%	100%
미세먼지 저감 수림대 조성 (총8개소)	장림유수지, 하신중앙로, 다대항, 다송로 (4개소)	을숙도대로, 구평택지 (2개소)	감천항 일원, 감천로·바람길숲 (2개소)	-	-

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	6,875		6,875	1,410	1,250	4,215		
국 비	2,758		2,758	150	500	2,108		
시 비	3,267		3,267	1,160	750	1,357		
구 비	850		850	100		750		

## 【추진실적】

- 2018. 01. ~ 11. : 미세먼지 저감 수림대 조성공사 시행 및 완료(4개소 1,410백만원)
- 2019. 01. ~ 12. : 을숙도대로 및 구평택지 일원 수림대 조성 조성완료(2개소, 1250백만원)
- 2019. 12. ~ : 감천항 일원 미세먼지 차단숲 조성사업 완료(1개소, 3,000백만원), 감천로 바람길숲 조성사업 市 산림생태과 추진(1개소, 1,215백만원)

## 【문제점 및 대책】


- 2020년도 감천항 일원 미세먼지 차단숲 추진에 따른 유관기관 협의 및 실시 설계 결과 일부 사업구간 축소 불가피하여 사업 대상지 조정

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
5회	1회	3회	4회	

## 【기대효과】

- 미세먼지 저감 기능의 수림대 조성과 생활권 주변 도시경관 향상

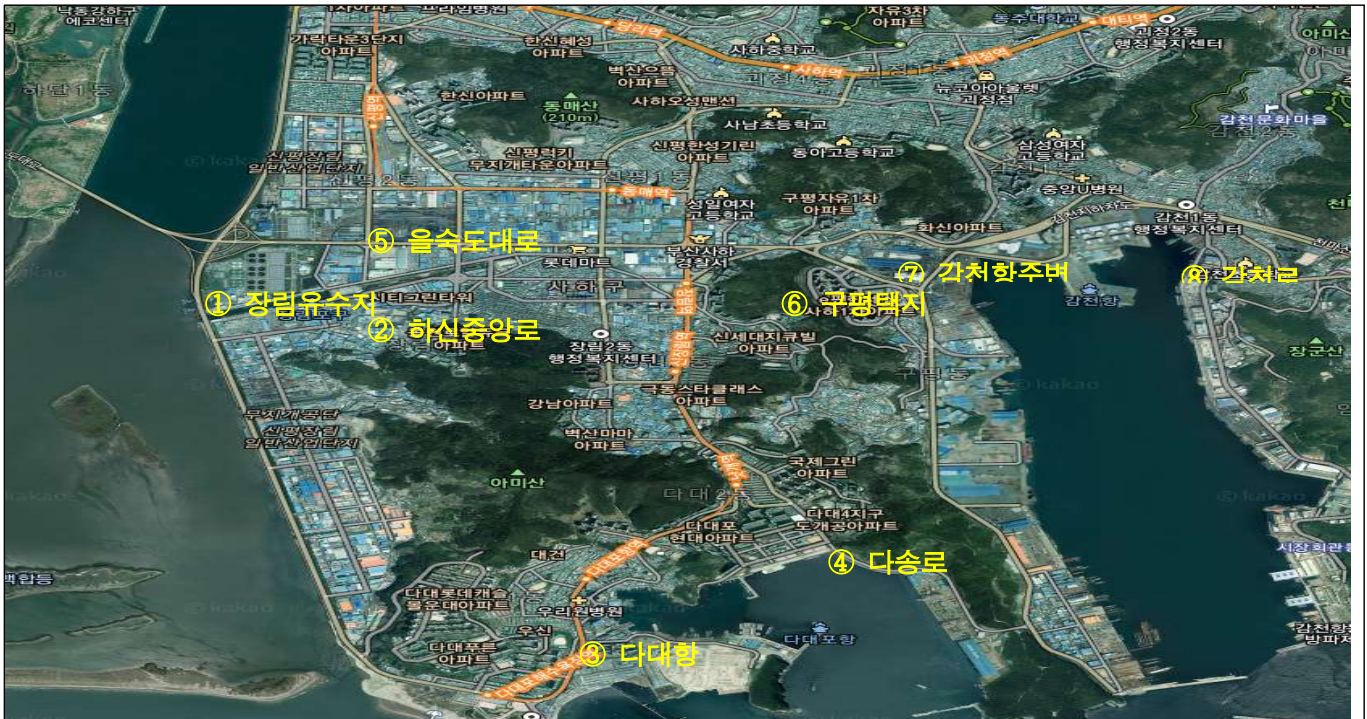

2018년	2019년	2020년	비 고
장림유수지, 하신중앙로, 다대항, 다송로	을숙도대로	구평택지 주변	감천항, 감천로
① ~ ④	⑤	⑥	⑦, ⑧
			8개소
