관리번호
5-5

을숙도 다목적 실내체육관 건립

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2020년~2023년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	5,500백만원	완료시기	임기내
추진부서	체육홍보과 체육지원담당 (김보성 ☎4124)	협조부서	건 축 과 (박명종 ☎4791)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

○ 문화생활과 생활체육 공간으로 많은 주민들이 이용하고 있는 을숙도 야외 테니스장에 철새의 계절이동에 영향을 주지 않으면서 주민의 생활체육 활성화에 기여할 수 있는 다목적 실내 생활체육관 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년

○ 사 업 비 : 5,500백만원(국비 1,350, 시비 1,575, 구비 2,575)

※ 구비 2,575백만원 : 구비 1,075, 특별교부세 500, 특별교부금 1,000

○ 위 치 : 사하구 하단동 1151-14번지

○ 규 모 : L=144m, B=43m, H=14m (부지 6,192㎡, 코트 8면)

○ 구 조 : 골조 막구조물

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	35%	100%	%	%	%	
을숙도 다목적 실내 체육관 건립	공사 진행	공사 준공				

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,500	4,500	1,000	500	500				
국 비	1,350	1,350							
시 비	1,575	1,575							
구 비	1,075	75	1,000	500	500				
기 타	1,500	1,500							

【추진실적】

○ 2019. 11. : 기초생활체육 저변확산 지원사업 선정(문체부)
○ 2020. 05. : 투자심사 완료, 사전심사 실시
○ 2020. 09. : 공유재산관리계획 반영
○ 2021. 04. : 지반조사용역, 기술심의위원회, 중간보고회 개최
○ 2021. 10. : 건축구조전문위원회 심의, 설계용역 완료
○ 2021. 12. : 공사 및 용역 입찰공고 및 계약
○ 2022. 01. : 공사 착공
○ 2022. 04. : 공사 중지 ▸ 구조물 설계변경 관련
○ 2022. 07. : 철골조 관련 설계변경 승인, 추가 사업비 승인(구비 5억원)
○ 2022. 10. : 문화재 현상변경 허가조건 변경 신청(철새도래기간 내 공사 추진)
○ 2022. 11. : 문화재 현상변경 허가조건 변경 승인 신청 불허 통보
○ 2023. 04. : 공사 재개
○ 2023. 07. : 기초 공사 완료
○ 2023. 10. ~ 11. : 막재 설치, 조명설치
○ 2023. 12. : 공사 준공
○ 2024. 01. ~ 04. : 시설 시범운영(무료)
○ 2024. 05. 01. : 정상운영(직영, 유료)

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	-	3회	-

【기대효과】

○ 문화생활 및 생활체육을 구민이 함께 즐기고 누릴 수 있는 을숙도 상단부 조성
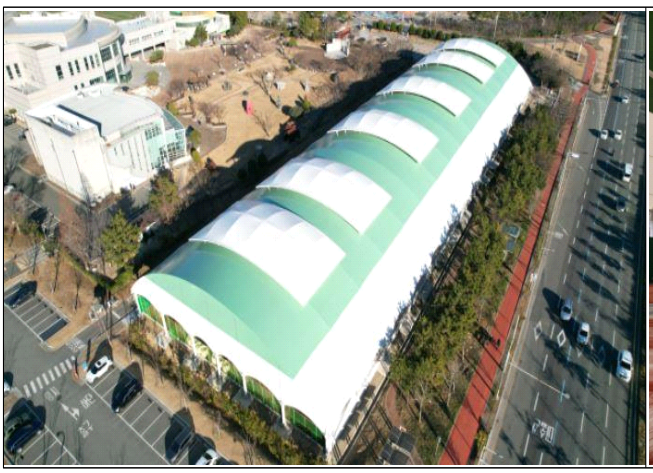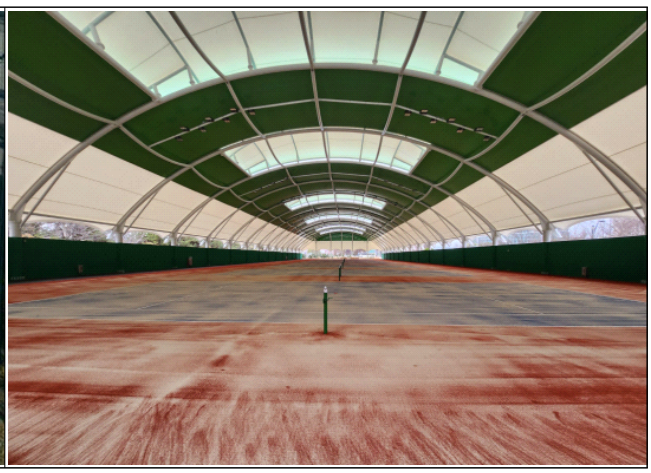
【관련사진】
