관리번호	대티터널 진입 상부공간 공원 조성
6-8	

사업구분	신규사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2026년	추진상황(%)	추진 중(20%)
소요예산	7,498백만원	완료시기	임기내
추진부서	산림녹지과 공원담당 (유연정 ☎4522)	협조부서	건설과 (최우준 ☎4692)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

○ 터널로 단절된 대티·까치마을을 연결하고 터널 상부 수림대를 정비하여 주민 커뮤니티(공원) 공간 조성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 사 업 비 : 7,498백만원(시비 5,601, 구비 897, 특별교부세 1,000)

- 도로복개구조물 L=36m, B=47m, A=1,692㎡ : 5,584백만원
- 구조물상부 공원조성 A=1,700㎡ : 870백만원
- 터널상부 수림대 정비 등 A=1,300㎡ : 100백만원
- 용역비(도시관리계획, 설계비, 감리비 등) : 944백만원

○ 사업내용 : 공원 조성 약 A=3,000㎡

- 보행교 가설 및 상부공원 조성 : A=1,700㎡ (L=36m, B=47m)
- 터널 상부 수림대 공원 조성 : A=1,300㎡

□ 세부추진계획

○ 도시계획시설결정 및 공원조성계획 수립과 실시설계 추진

○ 2023. 03. : 도시관리계획(문화공원) 결정 용역 시행

○ 2023. 07. : 기본 및 실시설계(토목) 용역 시행

○ 2024. 03. : 도시관리계획(문화공원) 결정 고시

○ 2024. 04. : 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 시행

○ 2024. 07. : 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 용역 시행

○ 2025. 01. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공(건설과, 산림녹지과)

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	1%	5%	20 %	55 %	100 %	
대티터널 진입 상부공간 공원화사업	타당성 용역 및 기본계획 수립 용역 추진	도시관리계획 시설 결정, 기본 및 실시설계(토목)	조경분야 설계 및 BF 예비인증 용역	토목 및 조경공사 시행	공사완료	

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,498	30	7,468	200	300	3,957	3,008	3	
국 비									
시 비	5,601		5,601	200	300	2,093	3,008		
구 비	897	30	867			864		3	
기 타	1,000		1,000			1,000			

【추진실적】

○ 2021. 09. : 부산시 15분 생활권 정책공모 추진 기본계획 수립(시장 결재)

- 2021년 제8차 지방재정투자 사전심사 완료(조건부)

○ 2021. 10. : 구·군 15분 생활권 필요사업 사전수요조사(부산시→구.군)

○ 2021. 12. : 15분 생활권 정책공모사업 가이드라인 알림 및 공모시행(부산시→구.군)

○ 2022. 02. : 대티터널 진입 상부공원화 타당성 및 기본계획 용역 시행

○ 2022. 04. : 부산시 15분 생활권 정책공모신청서 제출(구→부산시)

○ 2022. 05. : 부산시 15분 생활권 공모선정위원회 현장 확인 및 공모 PPT발표

○ 2022. 06. : 부산시 15분 생활권 정책공모 최종선정(6.13.)

○ 2022. 08. : 부산시 보조금 교부(2억원)

○ 2022. 10. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료

○ 2023. 02. : 도시관리계획(문화공원) 결정 용역 추진계획 수립 및 보조금 교부(3억원)

○ 2023. 03. : 도시관리계획(문화공원) 결정 용역 착수

○ 2023. 05. : 도시관리계획(문화공원) 결정 용역 일시중지

○ 2023. 08. : 기본 및 실시설계(토목) 용역 착수

○ 2023. 11. : 부산광역시 의회 의견 청취 및 반영

○ 2024. 03. : 도시관리계획(문화공원) 결정 고시
○ 2024. 04. : 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 시행
○ 2024. 07. : 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 용역 시행
○ 2024. 11. : 용역보고회 개최(사하구 15분생활권 정책공모 거버넌스 참여)

【문제점 및 대책】

○ 본 사업은 도시계획시설사업으로 행정절차(공원조성계획 결정 고시 및 도시계획시설사업의 실시계획인가 등) 이행에 많은 기간 소요됨
▷ BF인증 및 관련 기관 협의 등 조속 추진

【금후계획】

○ 2025. 1. ~ 12. : 토목공사 추진
○ 2026. 1. ~ 12. : 조경공사 추진 및 전체 사업 완료

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	-	-	-

【기대효과】

○ 부산시의 도시비전과 연계한 그린스마트 도시 조성
- 부족한 도심지 내 도시공원의 확보로 탄소중립 그린도시의 확대에 기여

○ 지역 내 부족한 휴식공간 확보로 지역 커뮤니티 공간 제공
- 주민들의 공원으로서의 휴식처 제공과 동시에 단절된 지역의 주민 화합의 광장으로서의 역할 동시 수행

○ 도시재생뉴딜사업과의 연계성 확보로 사업 효과 극대화
- 부산시 산복도로 르네상스 제8차 사업으로 추진된 까치행복마을센터(마을역량프로그램 강좌)시설과 연계하여 공원활동가를 양성하여 향후 시민 스스로가 관리하고 가꾸는 공원으로 관리
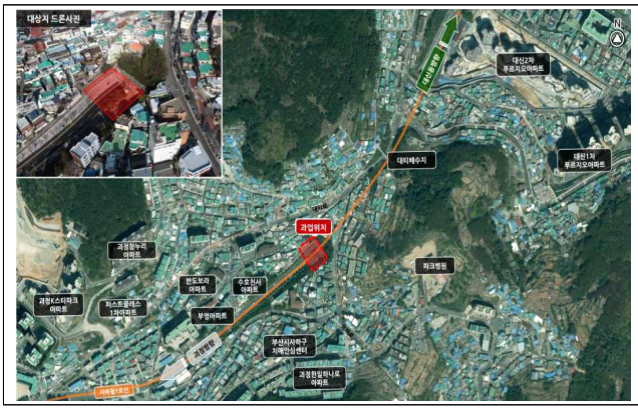
【관련사진】
